

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทาง หลวง	มาตรฐาน ทาง ที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.ค่าจ้างตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													ประจำ เดือน	สะสม	
1	420	-	งบประมาณ 2562 งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล. งานก่อสร้างสะพาน คสล.	16(นครศรีธรรมราช) สุราษฎร์ธานีที่ 1 (พนพิน)	28 + 980.00 (RT.)	700.00 ม.	-	125,700,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	7.80	30.00	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -8.71
			วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี นายยะสิทธิ์ มาเอียด โทร.081-979-0975										12.09	38.71	
2	4264	-	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายเมธา วิจิต โทร.090-2214-899	17(กระบี่) ตรัง	10 + 800.00 11 + 870.00 12 + 310.00	230.00 ม.	-	45,271,331.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	15.79	46.22	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -1.03
			นายสมจิต ผลิตเพชร โทร.089-658-1696										11.10	47.25	
3	4264	-	แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายสมจิต ผลิตเพชร โทร.089-658-1696	17(กระบี่) ตรัง	15 + 600.00	230.00 ม.	-	28,408,669.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	4.25	40.54	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
													3.65	39.53	
4	4013	-	นครศรีธรรมราช - ปากพนัง นายสุริยาวัธ รักรบรจ โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	30 + 973.00 34 + 015.00	70.00 ม.	-	24,160,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	13.91	32.16	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง -15.82
													13.25	47.98	

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงาน ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช

แผนงาน ก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ลำดับ ที่	หมายเลข ทาง หลวง	มาตรฐาน ทาง ที่	ชื่อโครงการ	สำนักงานทางหลวงที่ แขวงทางหลวง	เริ่มกม. - กม.	ขนาด โครงสร้าง (กม.)	สัญญาที่ ลงวันที่	1.คำนวณตามสัญญา 2.ประมาณค่าก่อสร้าง 3.งบประมาณ(บาท)	ผู้รับจ้าง	เริ่มลงมือ ทำงานจ้าง	วันสิ้นสุด สัญญา	เวลา ทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		1.ขั้นตอนดำเนินการ 2.ปัญหา/อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
													ประจำ เดือน	สะสม	
5	4013	-	ปากพนัง - หัวไทร นายยุทธศิลป์ ทุมมา โทร.089-569-5926 <u>งานขยายความกว้างสะพาน คสล.</u>	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	47 + 359.00 54 + 053.00	80.00 ม.	-	31,360,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	5.62	15.87	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
6	4038	-	คลองท่อม - ทุ่งใหญ่ บรรจบทางหลวงหมายเลข4125 (หาดเลา) นายสมจิต ผลึกเพชร โทร.089-658-1696 <u>งานซ่อมสะพาน คสล.</u>	17(กระบี่) กระบี่	18 + 807.110 20 + 323.740 22 + 791.306	70.00 ม.	-	28,300,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 ก.ย.62	365	13.66	53.11	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
7	401	-	สิชล - ท่าแพ นายสุริยาวัธ รักบรรจง โทร.081-719-4490	16(นครศรีธรรมราช) นครศรีธรรมราชที่ 1	275+144.62 (LT.) 275+347.37 (RT.)	88.00 ม.	-	1,200,000.00	ดำเนินการเอง	1 ต.ค.61	30 พ.ย.62	61	-	-	เนื่องจากยังมีน้ำทะเล หนุนสูง



งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและท่ออุโมงค์ คสล.

ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๔
กรมทางหลวง

สำนักก่อสร้างสะพาน
กระทรวงคมนาคม

งบประมาณปี 2562

1. งานก่อสร้างสะพานและท่ออุโมงค์ คสล.

1.1 งานก่อสร้างสะพาน คสล. จำนวน 4 โครงการ

- วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี กม.28 + 980.00 (RT.)
- แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 4125 (หาดเลา) กม. 10+800.00,11+870.00,12+310.00,15+600.00
- นครศรีธรรมราช – ปากพนัง กม.30+973.00,34+015.00
- ปากพนัง – หัวไทร กม.43+133.00,54+053.00

1.2 งานขยายความกว้างสะพาน คสล.

- คลองท่อม – ทุ่งใหญ่ กม.18+807.110,20+323.740,22+791.306

2. งานก่อสร้างบูรณะและปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ คสล.


2.1 งานซ่อมแซมสะพาน คสล. จำนวน 1 โครงการ

- สีชล – ท่าแพ กม. 275+144.62 (LT.) , 275+347.37 (RT.)

ผลงานประจำเดือน	9.55 %
ผลงานรวม	34.44 %
แผนงานประจำเดือน	11.41 %
แผนงานรวม	41.37 %
ซ้ำ	6.93 %
อุปสรรค	-


งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ชื่อสายทาง	ทางหลวงหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี (จังหวัด สุราษฎร์ธานี)		
งาน	ก่อสร้างสะพาน คสล. กม. 28 + 980.00 (RT.)		
ขนาด	(7x10.00) + (19x30.00) + (6x10.00) = 700.00 ม. ทางรถกว้าง 11.00 ม. ทางเท้า 1.50 ม. ขอบทาง 0.50 ม.		
งบประมาณ	125,700,000.00 บาท		
วันเริ่มต้นโครงการ	1	ตุลาคม	2561
วันสิ้นสุดโครงการ	30	กันยายน	2562
ระยะเวลาทำการ	365	วัน	
ผลงาน / แผนงาน	30.00	ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562	
	38.71		
ปัญหาอุปสรรค	-		
นายช่างโครงการ	นายยะสิทธิ์ มาเอียด นายช่างโยธาอาวุโส โทร. 081 - 9790 - 975		

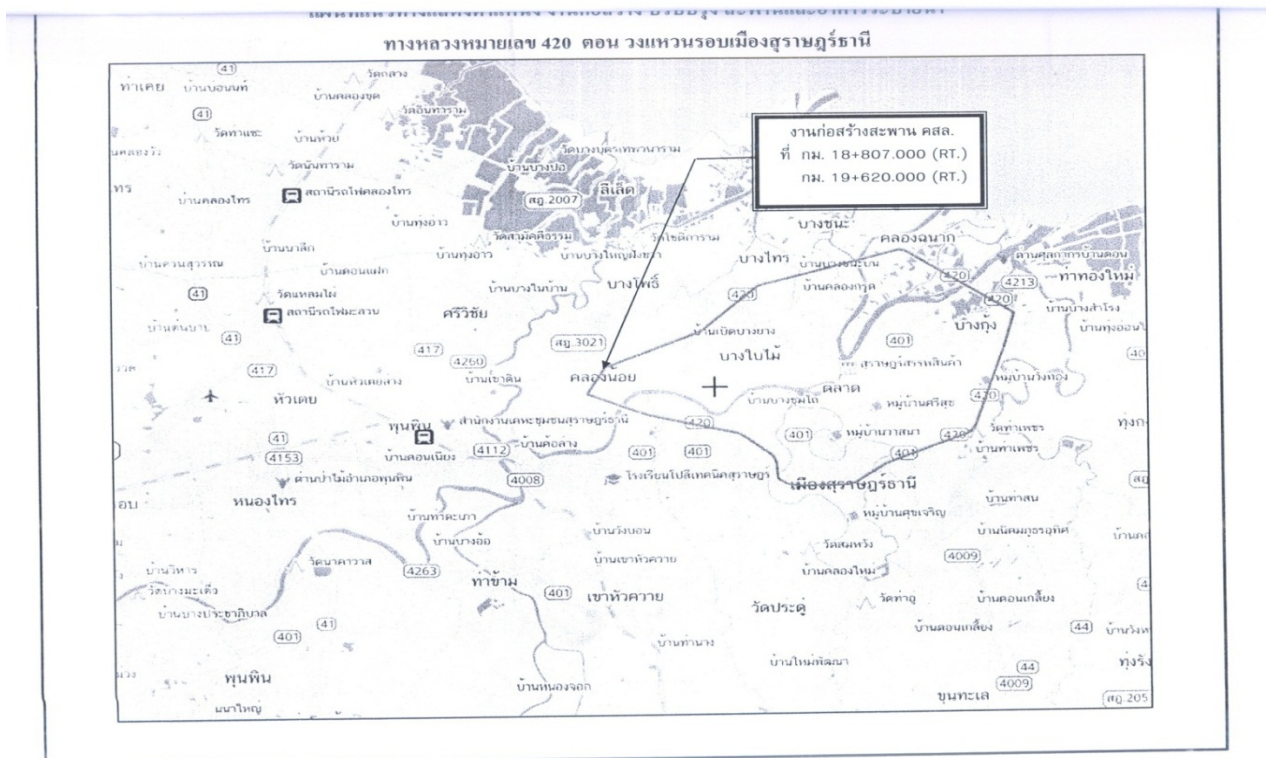


งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ชื่อสายทาง	ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 4125 (หาดเลา) (จังหวัด ตรัง)	
งาน	ก่อสร้างสะพาน คสล. กม. 10+800.00 , 11+870.00 , 12+310.00	
ขนาด	กม. 10+800.00 (2x10.00) + (3x20.00) + (2x10.00) =100.00 ม. ทางรถกว้าง 11.00 ม. ทางเท้าข้างละ 0.50 ม. กม.11+870.00 (3x10.00)=30.00 ม. ทางรถกว้าง 11.00 ม.ขอบทางข้างละ 0.50 ม. กม.12+310.00 (1x20.00) = 20.00 ม.ทางรถกว้าง 11.00 ม. ขอบทางข้างละ 0.50 ม.	
งบประมาณ	73,680,000.00 บาท	
วันเริ่มต้นโครงการ	1 ตุลาคม	2561
วันสิ้นสุดโครงการ	30 กันยายน	2562
ระยะเวลาทำการ	365 วัน	
ผลงาน / แผนงาน	46.22	ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
	47.25	
ปัญหาอุปสรรค	-	
นายช่างโครงการ	นายเมธา วิชิต นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 090 - 2214 - 899	

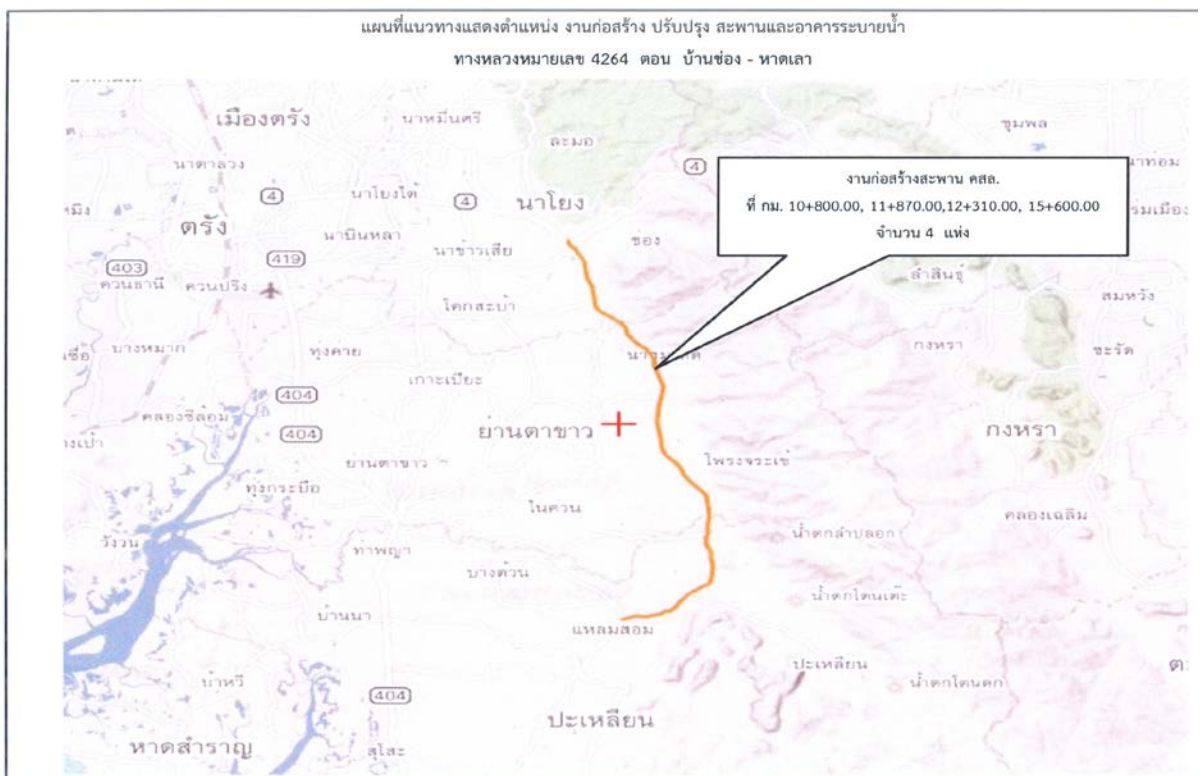


งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ชื่อสายทาง	ทางหลวงหมายเลข 4264 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (บ.ช่อง) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 4125 (หาดเลา) (จังหวัด ตรัง)		
งาน	ก่อสร้างสะพาน คสล. กม. 15 + 600.00		
ขนาด	(1×10.00) + (3×20.00) + (1×10.00) =80.00 ม. ทางรถกว้าง 11.00 ม. ทางเท้าข้างละ 1.50 ม.		
งบประมาณ	28,409,903.32 บาท		
วันเริ่มต้นโครงการ	1	ตุลาคม	2561
วันสิ้นสุดโครงการ	30	กันยายน	2562
ระยะเวลาทำการ	365 วัน		
ผลงาน / แผนงาน	40.54	ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์	2562
	39.53		
ปัญหาอุปสรรค	-		
นายช่างโครงการ	นายสมจิตร ผลึกเพชร นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 089 – 6581 - 696		

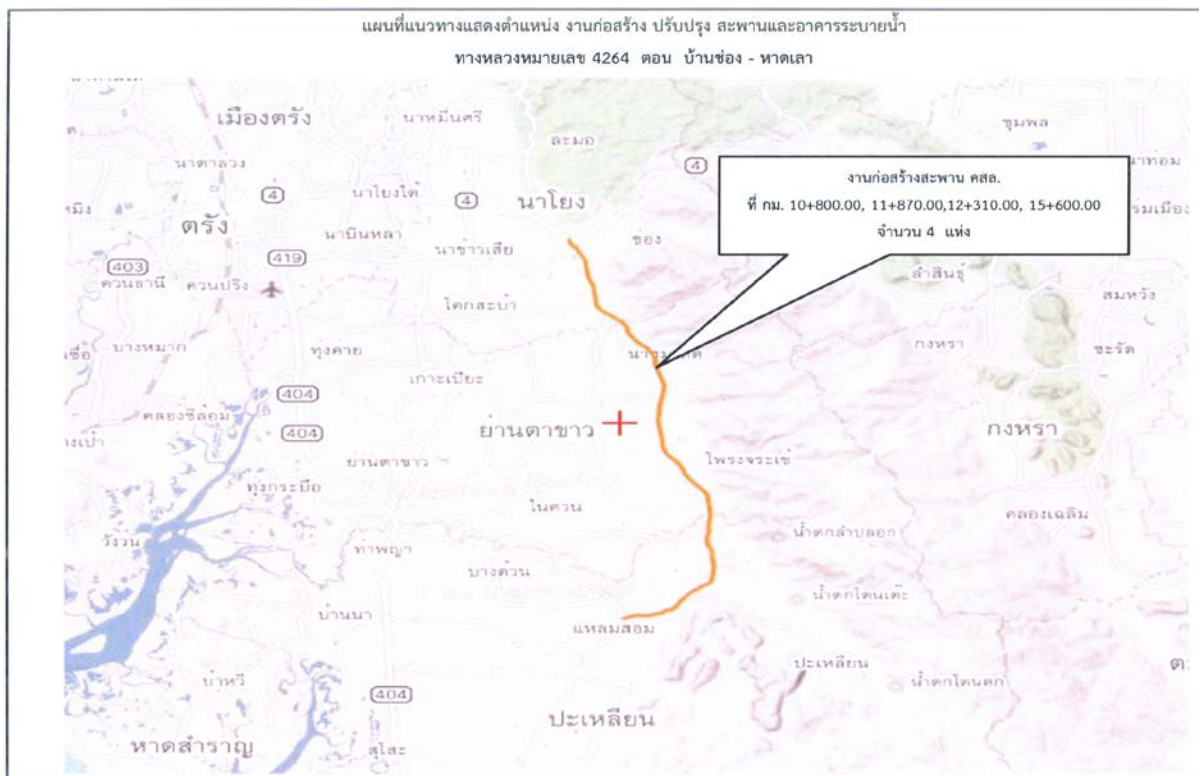


งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ชื่อสายทาง	ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน นครศรีธรรมราช – ปากพนัง (จังหวัด นครศรีธรรมราช)		
งาน	ก่อสร้างสะพาน คสล. กม. 30 + 973.00 , 34 + 015.00		
ขนาด	กม. 30 + 973.00 (3x10.00) =30.00 ม. ทางรถกว้าง 12.00 ม. ขอบทางข้างละ 0.50 ม.		
งบประมาณ	24,160,000.00 บาท		
วันเริ่มต้นโครงการ	1 ตุลาคม	2561	
วันสิ้นสุดโครงการ	30 กันยายน	2562	
ระยะเวลาทำการ	365 วัน		
ผลงาน / แผนงาน	32.16	ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์	2562
	47.98		
ปัญหาอุปสรรค	-		
นายช่างโครงการ	นายสุริยาวัธ รักบรรจง นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 081 – 7194 - 490		

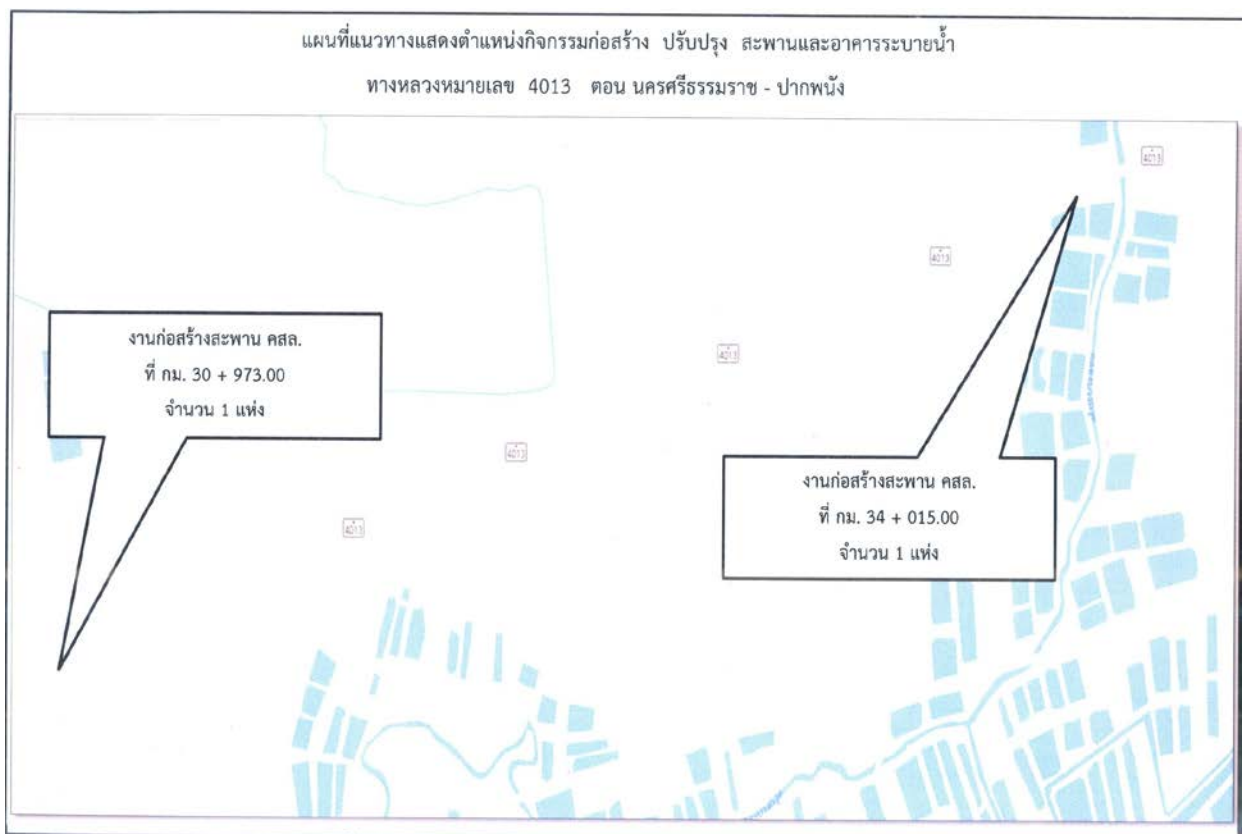


งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ชื่อสายทาง	ทางหลวงหมายเลข 4013 ตอน ปากพนัง – หัวไทร (จังหวัด นครศรีธรรมราช)		
งาน	ก่อสร้างสะพาน คสล. กม. 43 + 133.00 , 54 + 053.00		
ขนาด	กม. 43 + 133.00 (1×10.00) + (2×20.00)+ (1×10.00) =80.00 ม. ทางรถกว้าง 12.00 ม. ขอบทางข้างละ 0.50 ม.		
งบประมาณ	31,360,000.00 บาท		
วันเริ่มต้นโครงการ	1	ตุลาคม	2561
วันสิ้นสุดโครงการ	30	กันยายน	2562
ระยะเวลาทำการ	365 วัน		
ผลงาน / แผนงาน	15.87	ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562	
	19.78		
ปัญหาอุปสรรค	-		
นายช่างโครงการ	นายยุทธศิลป์ ทุมมา วิศวกรโยธาชำนาญการ โทร. 089-569-5926		

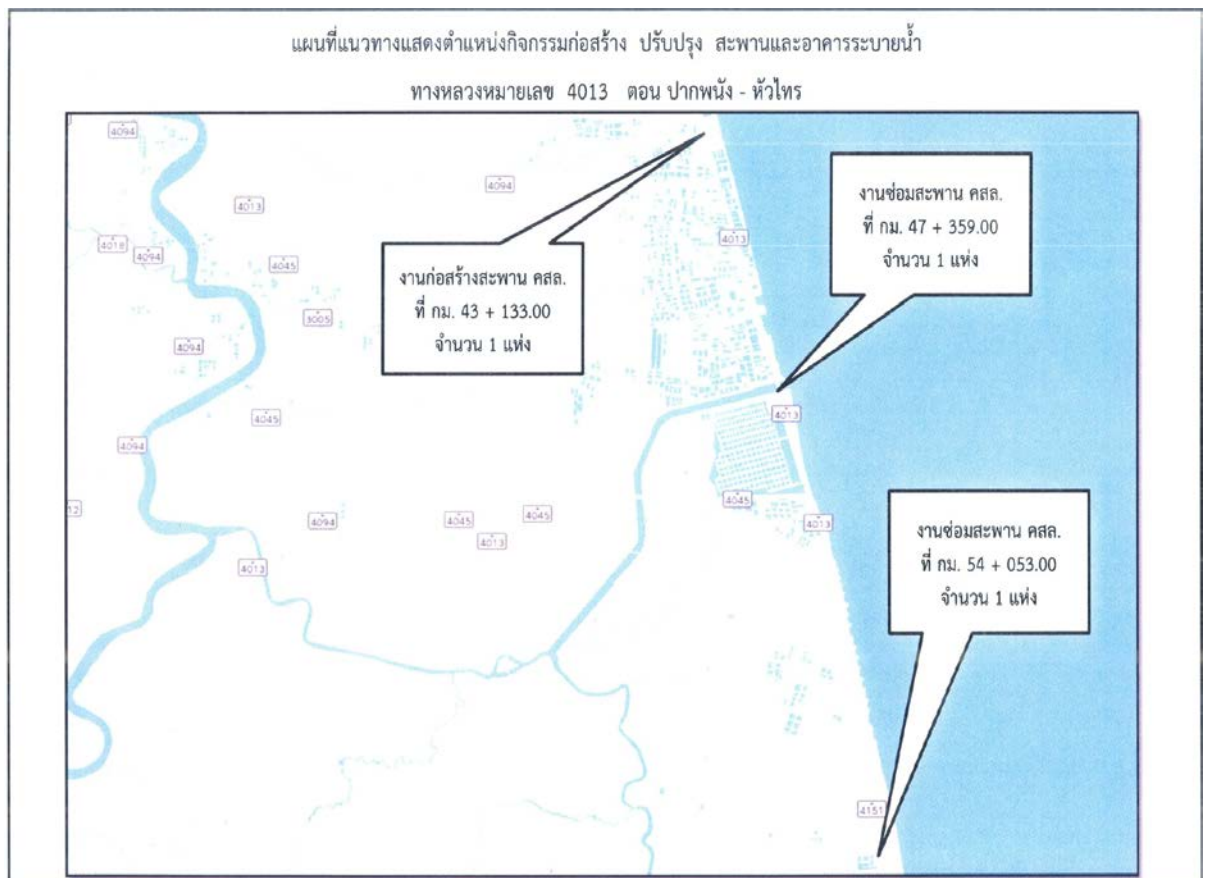

งานขยายความกว้างสะพาน คสล.

ชื่อสายทาง	ทางหลวงหมายเลข 4038 ตอน คลองท่อม – ทุ่งใหญ่ (จังหวัด นครศรีธรรมราช)		
งาน	ขยายความกว้างสะพาน คสล. กม. 18 + 807.110 , 20 + 323.740 , 22 + 791.306		
ขนาด	กม. 18 + 807.110 สะพาน (1x8.00) + (1x10.00)+ (1x8.00) =26.00 ม. กว้าง 7.00 ม. ขอบทางข้างละ 0.50 ม. ขยายความกว้างเป็น 22.00 ม. ขอบทางข้างละ 0.50 ม กม. 22 + 323.740 สะพาน (1x6.00) + (1x8.00)+ (1x6.00) =20.00 ม. กว้าง 7.00 ม. ขอบทางข้างละ 0.50 ม. ขยายความกว้างเป็น 22.00 ม. ขอบทางข้างละ 0.50 ม กม. 22 + 791.306 สะพาน (3x8.00) =24.00 ม. กว้าง 7.00 ม. ขอบทางข้างละ 0.50 ม. ขยายความกว้างเป็น 22.00 ม. ขอบทางข้างละ 0.50 ม		
งบประมาณ	28,300,000.00 บาท		
วันเริ่มต้นโครงการ	1	ตุลาคม	2561
วันสิ้นสุดโครงการ	30	กันยายน	2562
ระยะเวลาทำการ	365 วัน		
ผลงาน / แผนงาน	53.11	ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562	
	59.58		
ปัญหาอุปสรรค	-		
นายช่างโครงการ	นายสมจิตร ผลึกเพชร นายช่างโยธาชำนาญงาน		

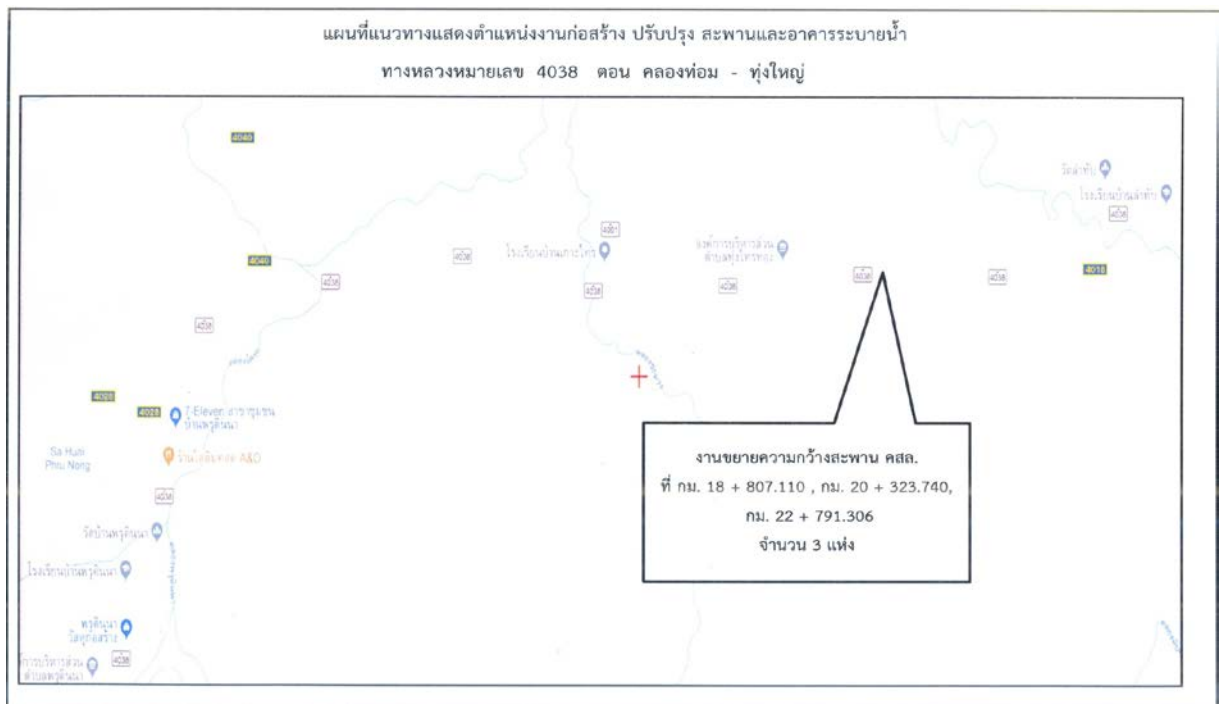

งานซ่อมแซมสะพาน คสล.

ชื่อสายทาง	ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สีชล – ท่าแพ (จังหวัด นครศรีธรรมราช)		
งาน	ซ่อมแซมสะพาน คสล. กม. 275+144.62 (LT.) , กม. 275+347.37 (RT.)		
ขนาด	กม. 30 + 973.00 (3x10.00) =30.00 ม. ทางรถกว้าง 12.00 ม. ขอบทางข้างละ 0.50 ม.		
งบประมาณ	1,200,000.00 บาท		
วันเริ่มต้นโครงการ	1	พฤศจิกายน	2561
วันสิ้นสุดโครงการ	31	ธันวาคม	2561
ระยะเวลาทำการ	61 วัน		
ผลงาน / แผนงาน	0.00	ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562	
	100		
ปัญหาอุปสรรค	เนื่องจากยังมีน้ำทะเลหนุนสูง		
นายช่างโครงการ	นายสุริยา วัชรบรรจง นายช่างโยธาชำนาญงาน โทร. 081 – 7194 - 490		

